

# 10. Juni 2025 Start mit Aushub, alle Bäume weg, abhumusieren



voher... und nachher



**26. Juni 2025 Der Aushub hinter dem Haus ist abgeschlossen. Das Eternit wurde bereits von der Fassade entfernt.**





**Am 30. Juni 2025 wurde das Stammhaus vollständig ausgeräumt. Am Abend fand eine Feuerwehrrübung, an der 60 Männer teilnahmen, statt.**



**Der Rückbau ist bereits weit fortgeschritten, und zwar in der Zeit vom Montag, den 30. Juni, bis Donnerstag, den 4. Juli.**






**Freitag, 4. Juli 2025 steht kaum noch etwas vom Stammhaus.**



**Unsere Ölheizung wird durch eine Luftwärmepumpe ersetzt. Daher wird der Öltank, der ein Fassungsvermögen von 20'000 Lt hat, entfernt. Ab Dienstag, 16. Juli, verändert der Kran unsere Aussicht. Nun stehen zwei Wochen Bauferien vor der Türe.**

**Nach den Bauferien setzt der Tiefbau die Arbeiten an der Luftwärmepumpe fort, wobei die neuen Leitungen nahezu eine Woche in Anspruch nehmen. Des Weiteren beginnt der Maurer Vicini mit den Vorbereitungen für die Bodenplatte.**

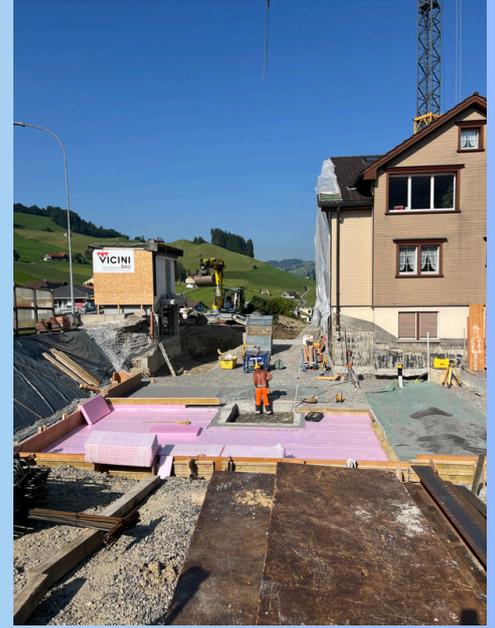

**5 Tage später ist bereits die Bodenplatte betoniert.**
